**GUIA** 

Y

# PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DIRECCION DE OO.PP.MM.



#### CERTIFICADO AMBIENTAL

#### GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Dade en GUAYAS, el 07 de marzo del 2018

#### CERTIFICADO AMBIENTAL No.2038-GPG-2018-CA-SUIA

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; así como los requerimientos previstos para esta actividad:

#### CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL a favor de :

PAVIMENTACION DE CALLES, SECTOR PERIMETRAL OESTE, PRE COOP: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE, HORIZONTES DEL GUERRERO 1,2 Y 3, GUERREROS DEL FORTIN 1 Y UNIDOS POR LA PAZ 2 Ubicado en :

Provincia

Cantón

Parroquia

GUAYAS

**GUAYAQUIL** 

TARQUI

A nombre de DOMENICA CRISTINA TABACCHI RENDON, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de la página web del SUIA de forma obligatoria.

#### DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: Datos Técnicos

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES. ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

#### Ubicación Geográfica

Dirección:

PÉRIMETRAL OESTE, PRE COOPERATIVAS:. EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2 FLOR DEL NORTE, HORIZONTES DEL GUERRERO 1, 2 Y 3, GUERREROS DEL FORTIN 1 Y UNIDOS POR LA PAZ 2

Provinci

Cantón

Parroquia

GUAYAS

**GUAYAQUIL** 

TARQUI

#### **Datos Administrativos**

Nombre del representante legal:

DOMENICA CRISTINA TABACCHI RENDON

Email:

bcoloma01@hbtmail.com

Teléfono:

042594800

Código de registro del proyecto:

MAE-RA-2018-344648

Dirección:

Pichincha 605 v 10 de agosto

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en el desarrollo de su actividad.

Atentamente.

LLAGUNO LAZO MARIA VERONICA GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Yo, DOMENICA CRISTINA TABACCHI RENDON con Cédula/RUC N° 0908984172 declaro bajo juramento que la información que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas por la ley.

Atentamente.

Sra.DOMENICA CRISTINA TABACCHI RENDON (Firma)

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programeción





Sistema Único de Información Ambiental - SUIA

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS Y BORDILLOS

CATEGORÍA I

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. tefe de la Unidad de Estudio y Programación





SUIA-MDA-GBPA-005

#### ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	D 3
		4
		4
		4
		5
		A6
		6
		TICA

OBRAS LUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z.

efe de la Unidad de Estudio y Programación





SUIA-MDA-GBPA-005

#### GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS Y BORDILLOS CATEGORÍA I

#### 1. INTRODUCCIÓN

Una mejor práctica de gestión ambiental es una acción o una combinación de las acciones llevadas a cabo para reducir el impacto ambiental de las operaciones de las actividades a ejecutar en un proyecto. Hay dos tipos de prevención de la contaminación: a) reducción en la fuente y b) reciclaje.

- a) Reducción en la fuente minimiza o elimina la generación de residuos.
- b) Reciclado se utilizan materiales para modificar su forma o características y se pone a su disposición para volver a utilizarse.

Así mismo, trata de dar un enfoque de concientización y capacitación, cuánto podemos aportar para minimizar la alteración del ambiente a través del buen uso de los recursos; aplicando sugerencias puntuales de buenas prácticas ambientales según sea la actividad que vayamos a realizar.

Esta Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA) pretende sensibilizar sobre la afección que generamos al medio ambiente, desde nuestras profesiones más comunes, aportando soluciones mediante el conocimiento de la actividad y la propuesta de prácticas ambientales correctas.

#### 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

La presente Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA) está dirigida a las personas cuyas actividades se establezcan en la construcción de calles, aceras y bordillos.

A través de la implementación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA), se tiene la posibilidad de reducir el impacto ambiental negativo generado por las actividades de cada uno de los trabajadores de manera individual, sin necesidad de sustituir o realizar cambios profundos en los procesos, aunque el impacto generado pudiera percibirse como no significativo, la suma de cientos de malas actuaciones individuales puede generar resultados globales adversos, por lo cual se pueden llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a su prevención o su reducción.

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación





**SUIA-MDA-GBPA-005** 

#### 3. RECOMENDACIONES

#### 3.1. FASE DE DISEÑO

- Deberá considerar la realización de un estudio preliminar, que tenga en cuenta los condicionantes del entorno donde se vaya a construir calles, aceras y bordillos, de manera que las características de la construcción reduzcan las posibles molestias al sector circundante.
- Planifique los tramos que serán objeto de construcción ya sea de calles, aceras y bordillos, con el objeto de realizar un trabajo organizado.
- Contemplar la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores que realicen los trabajos de construcción de calles, aceras y bordillos, así como la señalización de advertencia relacionada a dicha actividad.
- Integrar los materiales en el entorno para aprovechar los recursos del área.
- Armonizar los diseños de las edificaciones con el entorno, potenciando su integración en el paisaje.
- Usar los sistemas constructivos representativos de la zona de manera que se aprovechen los recursos del entorno y así aportar a la minimizar el consumo energético derivado del trasporte.

#### 3.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN

#### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

- Realizar la inspección visual de los materiales antes de su recepción para garantizar que lleguen al sitio en buenas condiciones.
- Solicitar a los proveedores que los vehículos de materiales de construcción cuenten con una lona que cubra dichos materiales para evitar la proliferación de polvo a lo largo del trayecto.
- Mantener ordenada la zona de recepción y acφpio.
- Proteger del sol, la lluvia y de la humedad los materiales y herramientas mediante lonas y elementos separadores del suelo.
- Calcular correctamente las cantidades de materia prima a emplear para evitar residuos, o sobrantes en
  las mezclas efectuadas.

  OBRAS PÚLLIOS MUNICIPALES
- Aprovechar al máximo los materiales evitando dejar restos en los envases.

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación





SUIA-MDA-GBPA-005

- Retirar y acopiar adecuadamente aquellos elementos que puedan tener una reutilización posterior: madera, tubería y otros.
- Comprar materiales de origen local, fabridados en zonas próximas.
- Utilizar siempre los elementos de protección personal, adecuados a los riesgos de las tareas en función de los materiales que se manipulan.
- Evitar la emisión de polvo, humedeciendo por aspersión las pilas de materiales o cubriendo los lugares de acopio.
- Apilar los materiales de manera que se eviten roturas en las bolsas.
- Evitar la caducidad de productos, pasado su vencimiento se transforman en residuos y no servirán para fines constructivos.

#### 3.3. TAREAS CON PINTURA

- No preparar más pintura de la necesaria.
- Proteger las superficies que no van hacer pintadas para evitar deterioros.
- Limpiar las brochas, pinceles, rodillos, espátulas, y demás herramientas después de ser usadas sin esperar que se seque la pintura.
- Realizar los trabajos en espacios ventilados.
- Usar mascarilla adecuadas para efectuar este tipo de actividad.

#### 3.4. OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO

- Una adecuada gestión de usos del suelo se realiza efectuando un correcto acopio de materiales y
  respetando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del mismo.
- Acopiar selectivamente los diferentes tipos función de las posibilidades de reutilización.
- Evitar derrames de aceites y líquidos de las maquinarias recolectándolos para su posterior entrega a los gestores autorizados.
- No verter los restos de hormigón madera, yeso, cal y restos de aguas de limpieza en el desague o alcantarillado o en el suelo.

   GERAS FUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Bunchón Z. Lefe de la Unidad de Estudio y Programación

Página 5

та осирасто-





Partition of the contract

SUIA-MDA-GBPA-005

 Los vehículos que efectúen el trasporte de tierras, escombros o materiales de construcción lo harán en las debidas condiciones para evitar el vertido accidental de su contenido, adoptando las precauciones necesarias para impedir ensuciar las vías públicas.

#### 3.5. REDUCIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

- Tener siempre en cuenta la dirección del viento para evitar exposiciones a terceros (ruido y polvo).
- Evitar la generación de ruidos molestosos en el ambiente laboral y vecindario, evitar realizar tareas nocturnas que generen ruidos fuertes y molestosos.
- Instruir, capacitar y controlar que los trabajadores que estén expuestos a ruidos fuertes y en tiempos prolongados cuenten con sus respectivos contaminación por ruido.
- Evitar el uso indebido de mecanismos de comunicación, música y otros.
- Evitar en gran medida la emisión de partículas de cemento y polvo.
- Humedecer las superficies a tratar, que prevean la generación de polvo (tome en cuenta la inhalación de partículas de cemento pueden derivar en enfermedades pulmonares).

#### 3.6. USO RACIONAL DEL AGUA

- El agua es un recurso primordial e indispensable para la construcción por tal razón se debe cuidar; realizando acciones como: cerrar bien las llaves de paso de inmediato después de su uso.
- Las mangueras que se empleen deben tener llaves de paso en su entrada y salida para facilitar el cierre y reducir las pérdidas y goteos.
- Controlar que la cantidad de agua utilizada para la preparación de mezclas, de áridos, limpieza y
  otras actividades, sea la adecuada a las necesidades.
- Reutilizar, siempre que sea posible, el agua de limpieza, almacenándola en recipientes que faciliten la decantación de los sólidos.

 Utilizar detergentes biodegradables, sin fosfato ni cloro, en la limpieza de utensillos y equipos del personal.

> Ing. Gregorio Banchón Z. Jefe de la Unidad de Estudio y Programación

OBRAS PÚBLIZAS

Página 6





SUIA-MDA-GBPA-005

- No verter en el suelo, ni en cursos de agua, ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o productos peligrosos.
- Evitar el vertido de agua que contengan cemento u otros productos procedentes de la limpieza.

#### 3.7. AHORRO DE ENERGÍA-EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Es recomendable aprovechar la luz natural durante toda la jornada laboral para evitar la iluminación artificial innecesaria.
- Emplear lámparas de bajo consumo y apagar los equipos y luces que no se utilicen.

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación





SUIA-MDA-GBPA-005

		ACIÓN DEL DOCUMENTO	
Elaborado por:	Especialistas Ambientales, CAN MA	Æ	11 de Abril 2015
Revisado por:	Coordinadores Dirección Nacional Ambiental	de Prevención de la Contaminación	11 de Abril 2015
Aprobado -por:	Subsecretaría de Calidad Ambiental - Dirección Nacional de Prevención de		11 de Abril 2015
Fecha:	Quito, 11 de Abril 2015		

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchan Z.
lefe de la Unidade Estudio y riogramación

## PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

The second control of the control of

El presente Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de aplicación sistemática de las medidas ambientales de Mitigación, Prevención y Contingencia.

De esta forma. El PMA está orientado a cristalizar las acciones que permitan evitar, mitigar, corregir, restaurar y compensar los daños ocasionados en el proyecto en su fase de construcción.

Es responsabilidad del contratista conocer la legislación ambiental y cumplir con las disposiciones allí contenidas, esto es, leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance nacional, regional o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de proteger el ambiente.

El contratista debe procurar la menos afectación e impactos negativos sobre los suelos, cuerpos de agua, calidad del aire, vegetación, fauna, áreas protegidas y maximizar el bienestar de la población durante la ejecución de la obra hasta la entrega de la misma.

La fiscalización, responsable de la supervisión del proyecto, inspeccionará y confirmará que todas las normas ambientales establecidas en la legislación vigente sean cumplidas y las medidas de mitigacion ambiental sean debidamente ejecutadas durante la construcción del proyecto.

Toda contravención o acciones de personas que habiten o trabajen en la obra y que originen daño ambiental deberá ser conocida por la fiscalización. El Contratista será responsable de ejecutar la acción correctiva apropiada y con cargo a su costo, el mismo que será determinado y valorado por la fiscalización.

En este proyecto se presentan las medidas ambientales mas representativas para el avance de la obra, por lo que no se ha considerado la instalación de campamento alguno, siendo esto de responsabilidad del Constructor, así como también el mantenimiento de las maquinarias a utilizarse cambios de aceite, etc., deberá realizarse en lugares alejados al área de trabajo y en horas fuera de horario de trabajo, para evitar la contaminación del suelo y no perturbar el avance de la obra.

Las medidas ambientales necesarias que pueden tomarse para el presente proyecto son las siguientes, las mismas que serán verificadas y controladas por la Fiscalización y Supervisión de la obra

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación

# • PLAN DE PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

# MEDIDA N° 1 IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAMENTO

MPre 1

#### OBJETIVO:

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal técnico y administrativo, instalando un centro de oficina y acopio provisional de materiales y equipo liviano, para efectos de planificación y control.
 Mantener el orden y aseo dentro de la obra

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Desperdicios o pérdidas de material en obra

#### **RESPONSABLE:**

Jefe del Proyecto / constructor

#### ACTIVIDAD N° 1:

Determinar un lugar de trabajo y reuniones del personal de la obra

#### PROCEDIMIENTO:

Es necesario durante la ejecución de obras de construcción en la vía pública, contar con un lugar seguro y confortable, en donde se pueda planificar y controlar las actividades referentes a la obra en construcción, sin obstaculizar dichas actividades ni generar riesgos en la seguridad de los trabajadores y de los transeúntes, para tal efecto se debe alquilar un solar o casa, adecuados para el funcionamiento de una oficina.

De no contar con servicios higiénicos, se deberán alquilar baterías sanitarias móviles.

El local deberá ser adecuado con equipos necesarios para las actividades a realizarse.

#### **DOCUMENTO DE REFERENCIA:**

MΦP-001-F-2002

#### INDICADORES VERIFICABLES:

Verificación física de las Instalaciones del campamento en condiciones adecuadas para su funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones determinadas en este Plan de manejo

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

✓ Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de reuniones, revisiones de planos, etc.
 Campamento debidamente diseñado.

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Incluído en los costos indirectos

#### ACTIVIDAD N° 2:

peterminar un lugar de acopio para los materiales de construcción

#### PROCEDIMIENTO:

A la par de la construcción del centro de reuniones, se debe construir un centro de acopio para los materiales de construcción de la obra.

- Se deberá ubicar en el proyecto lugares apropiados para el acopio de material a ser utilizado en la construcción.
- Los lugares deben ser cercados para evitar la dispersión de los materiales y deberán contar con protección para cualquier tipo de infiltración o contaminación del suelo.
- Las características mínimas que debe reunir el lugar de acopio del material son:
- Deben tener protección en caso de lluvias: techo o cubierta.
- Tener accesos fáciles para las volquetas o camiones que transportan el material y accesos seguros para los obreros que tengan que retirar material en carretillas.
- Debe estar cerca de la caseta de trabajo para que se pueda controlar la entrada y salida del material de construcción.
- No deberá almacenarse sustancias combustibles ni inflamables cerca de posibles fuentes de cortocircuitos o fuego.
- El área será de 5 metros de ancho por 5 metros de largo.
- La estructura consistirá en pilares de madera y un tejado de zinc para proteger por las lluvias.

#### Manejo y Almacenamiento de Materiales

El almacenamiento de materiales deberá hacerse de manera tal que no se interfiera con el funcionamiento adecuado de los trabajos que se estén realizando en el proyecto.

Deben dejarse pasillos de transito libres de obstáculos y lo suficientemente amplios ya sea para el tránsito de operación a pie si van a operar montacargas, carretillas o cualquier otro transporte mecánico.

Los materiales que vayan a almacenarse deben ser de una misma clase y po entremezclarse. Tampoco deben colocarse junto a materiales sólidos, elementos de fácil combustión o inflamables.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Barthón Z.
Lefe de la Unidad de Estudio y Programación

El apilado y desapilado debe hacerse tomando las medidas de seguridad apropiadas.

Debe prestarse especial atención a la estabilidad de las rumas, para lo cual las estibas deben hacerse sobre bases de apoyo sólidas, que no tengan riesgo de deformaciones, debiendo someterse a controles de peso y pruebas de resistencia a fin de evitar la sobrecarga del piso sobre el cual se apoyan.

#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

Libro de obra y planillas de la construcción del lugar de acopio de materiales.

Formulario de recepción de Materiales, en el que debe indicar la fecha, cantidad y material que se recibe en la pbra, además debe contener las firmas de los responsables que los entregan y reciben.

COSTO DE LA MEDIDA: Incluído en los costos indirectos

#### ACTIVIDAD N° 3:

Determinar y adecuar un lugar de acopio para desechos de construcción.

#### PROCEDIMIENTO:

A la par de la construcción del centro de reuniones y del centro de acopio de materiales, se deberá construir un centro de recolección de desechos de construcción.

- Se deberá ubicar en el proyecto lugares apropiados para la recolección de los desechos de construcción, el cual debe ser cerrado y en el que sólo se colocará material de escombros, y ciertos líquidos como aceites y grasas, siguiendo las normativas respectivas.
- Los lugares deben ser cercados para evitar la dispersión de los materiales y deberán contar con protección para cualquier tipo de infiltración o contaminación del suelo.
- Las características mínimas que deben reunir el lugar de recolección de desechos de material de construcción son:
- Deben ser cerrados, con protección en caso de lluvias: techo o cubierta.
- Tener accesos fáciles para las volquetas o camiones que desalojarán el material y accesos seguros para los obreros que tengan que llevar escombros en carretillas.
- Debe estar cerca del ingreso al campamento para facilitar la retirada del material de desalojo.
- No deberá almacenarse sustancias combustibles ni inflamables cerca de posibles fuentes de cortocircuitos o fuego.
- Deberá seguirse en plan de manejo de aceites usados e hidrocarburos para evitar impactos negativos.
- E) área será de 4 metros de ancho por 5 metros de largo.
- La estructura consistirá en tablas, cuartones y tiras de madera con un tejado de zinc para proteger el material del clima.
- Se recomienda que el material de desalojo sea llevado al relleno sanitario las iguanas, previa aceptación de la Dirección de Aseo Urbano y Rural. No debe ser desalojado en áreas que comprometan los cauces naturales o artificiales de la ciudad de Guayaquil.
- El material de desalojo que tenga características buenas para relleno, deberá ser reutilizado o en su defecto sólo podrá ser desalojado a petición de los propietarios de los terrenos.

#### INDICADORES VERIFICABLES:

Libro de obra y planillas de la construcción del lugar destinado para la recolección de desechos sólidos. Verificación diaria del correcto funcionamiento y buen estado del área.

#### CO\$TO DE LA MEDIDA:

Incluído en los costos indirectos

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- Minimizar el esparcimiento de material particulado en las áreas de influencia y vía pública
- ✓ Mantener el aseo y orden dentro de la construcción.
- ✓ No colocar material de escombros en la vía pública, ni zonas verdes o recreacionales.
- ✓ Descargar escombros en los sitios autorizados por la M. I. Municipalidad de Guayaquil.
- Evitar la contaminación del suelo con material de construcción o sus desechos.

Disminuir el impacto en la red de alcantarillado y drenaje pluvial

COSTO DE LA MEDIDA:

Incluído en los costos indirectos

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchán Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación

#### MEDIDA N° 2 ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS

MPre 2

#### **OBJETIVO:**

Facilitar servicio al personal de la obra

**POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** 

Recolección de excretas y transporte hacia lugares no autorizados

#### **RESPONSABLE:**

Constructor / Fiscalizador

#### **ACTIVIDAD N° 1:**

Ubicación de Baterías Sanitarias

#### PROCEDIMIENTO:

- Se deberá ubicar un predio (solar vadío) en el área de influencia directa del proyecto, el cual deberá contar con un espacio suficiente para ubicar la Batería Portátil.
- La ubicación de esta batería deberá estar alejada de Centros de Salud, Locales Educativos u otras instituciones sensibles con el fin de no afectar ni obstruir sus actividades normales.
- Restringir el ingreso de personal no autorizado o ajeno a la obra.
- Deben ser revisadas y vaciadas regularmente para evitar el rebose.
- Deben estar en un área a la que debido al fuerte olor que emanan, principalmente durante la limpieza, es preferible que no se encuentren cerca de vías públicas o de áreas en donde habitan personas.
- Deben estar en una superficie plana para evitar que se vuelquen.



#### **DOCUMENTO DE REFERENCIA:**

Especificaciones Técnicas del Proyecto

#### INDICADORES VERIFICABLES:

Verificación física de las Instalaciones del campamento en condiciones adecuadas para su funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones determinadas en este Plan de manejo

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- ✓ Mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en la obra
- ✓ Evitar malestar en los moradores del sector Mejorar el desarrollo de la obra

COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación

MEDIDA N° 3 MPre 3 AGUA PARA CONTROL DE POLVO **OBJETIVO:** Disminuir la contaminación del aire a causa de material particulado **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Problemas de salud y Seguridad Pública y Laboral. RESPONSABLE: Contratista ACTIVIDAD Nº 1: Humedecimiento del Terreno PROCEDIMIENTO: El contratista deberá humedecer continuamente las áreas abiertas en las que se levanta material particulado durante la etapa constructiva. El transporte de materiales deberá efectuarse a velocidades menores a 40 km/h y las volquetas deberán estar cubiertas con lonas. • El contratista deberá dotar a los trabajadores mascarillas o implementos necesarios de uso personal durante la jornada de trabajo. • Previo al volteo de material de agregados de base o sub-base, el contratista deberá humedecer los mismos, para minimizar la generación de polvo. **DOCUMENTO DE REFERENCIA:** Especificaciones Técnicas del Proyecto **INDICADORES VERIFICABLES:** Verificación diaria del humedecimiento del suelo Revisión del libro de obra. **RESULTADOS ESPERADOS:** OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Evitar la difusión en el aire del material particulado. **COSTO DE LA MEDIDA:** Costo incluído en el presupuesto de la obra

Ing. Gregorio Banchón Z.

lefe de la Unidad de Estudio Programación

# MEDIDA N° 4 CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO

MMIt 1

#### **OBJETIVO:**

Disminuir la contaminación del aire a causa del material particulado

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Molestias a la comunidad

#### **RESPONSABLE:**

Constructor

#### ACTIVIDAD Nº 1:

Delimitar el área de afectación

#### PROCEDIMIENTO:

Los problemas de emisiones difusas de partículas no tienen una solución única y universal, ya que son muchos los factores que intervienen, desde el tamaño de partícula y la humedad, hasta la velocidad y turbulencia del viento incidente. Las barreras contra polvo pretenden actuar sobre estos dos últimos factores, reduciendo la velocidad y la turbulencia de viento en la zona a sotavento(vientos fuertes) de la barrera sin generar a su vez turbulencias que favorezcan las emisiones. La configuración más adecuada corresponde a una barrera artificial o natural (vegetal) situada perpendicularmente a la dirección del viento frente al que se quiere proteger el área de trabajo.

Para reducir la turbulencia en las zonas de protección de las barreras, éstas deben tener una porosidad superior a 0,20 mm.. Una barrera porosa es capaz de proteger una distancia a sotavento (vientos fuertes) del orden de 15 veces su altura.

Por lo que se deberá colocar de manera perimetral en el área donde se esté generando un alto índice de polvo, o donde se estén manipulando los materiales a utilizarse en la construcción del proyecto mallas Geotextiles fabricadas con fibras de polipropileno, poliéster ó polipropileno; la resistencia de los geotextiles va desde 15 Kn/m hasta 1000 Kn/m.



#### **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Especificaciones Técnicas del Proyecto

#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

Revisión del cumplimiento de la medida

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

Disminución de generación de polvo

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PIBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. Lefe de la Unidad de Estudio y Refranción

# • PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

#### MEDIDA N° 5 **TANQUES METALICOS PARA BASURA (55 Glns)**

MMit 2

#### OBJETIVO:

Disminuir la contaminación del aire a causa del material particulado Distribución adecuada de los escombros generados en la obra

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Contaminación del suelo y aire

Enfermedades

Presencia de insectos, roedores

#### RESPONSABLE:

Constructor

#### ACTIVIDAD Nº 1:

poner el sitio para la ubicación de los tachos metálicos

#### PROCEDIMIENTO:


El área de campamento contará con tres tachos metálicos con capacidad para 55 galones para:

- Basura doméstica[ restos de comida, restos de vianda, papeles y cartones no reciclables],(pintado de color verde y con letras blancas "BASURA ØRGÁNICA")
- Desechos metálicos (chatarras, restos metálicos, cables eléctricos, cables de acero, alambres, latas sin resto de aceite, grasas y pinturas], (pintado de color negro y con letras blancas "METALES")
- Lubricantes y aceites ya usados[Filtros de aceite y diesel usados, trapos, estopas y guantes embebidos con combustibles e hidrocarburos, latas y restos de pintura] (pintado con pintura reflexiva color naranja y con letras negras "ACEITES Y LUBRICANTES USADOS")

Las letras serán de 25 centímetros de alto e irán en dos frentes de los tachos.

El destino final de este tipo de materia será el relleno sanitario Las Iguanas ó los carros recolectores de basura de la concesionaria de este servicio.

En el caso de los desechos de combustibles, el contratista deberá obtener el registro generador de desechos peligrosos y será la persona encargada de entregar los desechos peligrosos al gestor autorizado.



BBRAS PÚBLICAS

Ing. Gregorid

#### **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Especificaciones Técnicas del Proyecto

#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

lefe de la Unidad de Estudio y Programación Verificación diaria del correcto funcionamiento y buen estado de los tachos y su disposición final. Registros de la disposición final de los tachos.

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

Disminuir el impacto en el suelo y aire, también la presencia de insectos, roedores y enfermedades.

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

# MEDIDA Nº 6 Transporte Adecuado de Material de Desalojo

MMH 3

#### **OBJETIVO:**

Disminuir la contaminación del aire a causa del material particulado

Distribución adecuada de los escombros generados en la obra

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Afectación a la salud de las personas

#### **RESPONSABLE:**

Constructor

#### ACTIVIDAD Nº 1:

Recolección, clasificación y disposición final de los residuos no peligrosos.

#### **PROCEDIMIENTO:**

El contratista hará el desalojo del material producto de las remociones, excavaciones, etc, en el Relleno Sanitario Las Iguanas o en sitios propuestos y aprobados por la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Medio Ambiente.

- En caso de ser necesario deberá stockear el material de desalojo en sitios que no obstruyan la ejecución de la obra y las labores rutinarias de los habitantes del sector.
- El desalojo de estos materiales deberán efectuarse a velocidades menores a 40 km./h y las volquetas deberán estar cubiertas con lonas.
- Se deberá tener cuidado con el objeto de no obstruir, por medio de los materiales de obras o material de desalojo, los sistemas de drenaje o de alcantarillado público, para lo cual deberá el contratista instalar las protecciones del caso.
- El constructor deberá limpiar las áreas cuando, por producto de los sobrantes de material, éstos sean arrastrados a otros lugares e interrumpan las vías de acceso o taponen alcantarillas existentes en el sector.



DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Especificaciones Técnicas del Proyecto

**INDICADORES VERIFICABLES:** 

Revisión del cumplimiento de la medida

**RESULTADOS ESPERADOS:** 

Disminuir el impacto en el suelo y aire, también la presencia de insectos, roedores y enfermedades.

COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchon Z.

lefe de la Unidad de Estudio programación
os. roedores y enfermedades.

#### FORMATO N° 1

#### VOLUMEN DE MATERIAL SOBRANTE A DISPONER

PROYECTO:  PAVIMENTACIÓN DE CA BORDILLOS CUNETAS Y SIST PERIMETRAL OESTE (SEC COOPERATIVAS: EL MIRA FLORIDA, COLINAS DE LA NORTE, HORIZONTES DEL GUERREROS DEL FORTÍN 1 Y PARROQUIA TARQUI	EMA DE AA.LL. SECTOR SÚN GRÁFICO), PRE- DOR, LOMAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL GUERRERO 1, 2 Y 3,	MANO.	
CIUDAD:		CONTRATISTA:	
CONTRATO No.:			
FECHA	VOLUMEN TRANSPORTADO (m3)	PLACA DE LA VOLQUETA	
Contratista		Fiscalizador	
		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  Ing. Gregorio Banchón Z.  lefe de la Unidad de Estudio programación	

# • PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

# MEDIDA N° 7 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

MPre 4

#### **OBJETIVO:**

Promover que la sociedad civil se transforme en un interlocutor activo de la discusión pública y de la toma de decisiones, promoviendo canales de vigilancia de la gestión y servicios públicos.

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

- Carencia de información de la comunidad influenciada en el área del proyecto.
- Dificultades con los moradores para el desarrollo del proyecto y la implementación de las medidas ambientales designadas.
- No conformidad de moradores por interferencias del proyecto en los servicios básicos.

#### RESPONSABLE:

Constructor

#### ACTIVIDAD N° 1:

Programa de Comunicación

#### **PROCEDIMIENTO:**


Se realizará una charla-taller donde se dará a conocer el contenido del Plan de Manejo Ambiental, así como los primeros auxilios en casos de emergencia:

#### Contenido de las charlas:

- 1. Introducción y Definiciones Generales (5 minutos)
- 2. Explicación Detallada de cada una de las medidas a seguir por el personal de obra:
- Correcta actitud en el trabajo: puntualidad, responsabilidad, cumplimiento (10 minutos)
- Uso de Implementos de Protección Personal (20 minutos)
- Colocación de las debidas señalizaciones en cada actividad que lo requiera (15 minutos)

El objetivo de los temas propuestos es dar a conocer a la comunidad los diferentes componentes y medidas del plan de manejo ambiental del proyecto. Con las nociones de primeros auxilios que se les impartirá se ayudará a sostener situaciones de emergencia durante la fase de construcción.

El perfil del expositor será un profesional de tercer nivel o delegado de la Cruz Roja, que tenga conocimientos sobre Planes de Manejo Ambiental, primeros auxilios y recursos humanos



# DOCUMENTO DE REFERENCIA: Especificaciones Técnicas del Proyecto INDICADORES VERIFICABLES: Listado de personas que asistan a las charlas Fotografías de asistencia a las charlas Ing. Gregorio Banchón Z RESULTADOS ESPERADOS: Ciudadanía consciente e informada de los beneficios, posibles molestias y soluciones de la obra.

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

# FORMATO N° 2 ACTA PARA LA REUNION GENERAL

		<del>7</del>
PROYECTO:  PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIME (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COOPERATIVAS: EL LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLOR DEL NORTE, HORIZONTES DEL GUERRERO GUERREROS DEL FORTÍN 1 Y UNIDOS POR PARROQUIA TARQUI	TRAL OESTE MIRADOR, RIDA 2, FLOR 1. 2 Y 3.	LOCALIDAD
BARRIO / COOPERATIVA		UBICACIÓN
CONTRATO No.		CONTRATISTA
REUNION No.		COMUNIDAD ATENDIDA
FECHA:		RESPONSABLE

Encabezamiento: Fecha, día, hora, local de reunión.

Orden del día: Puntos que se trataran en la reunión.

Análisis de los puntos tratados:

Se incluirán las inquietudes de los participantes.

Resoluciones y Recomendaciones finales:

Los acuerdos que han llegado por consenso llevar adelante.

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Grego io Bancha Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación

Firma de los convocantes y asistentes:

Al término del Acta constaran las firmas de quienes convocaron a la reunión acompañada de la firma de las personas asistentes.

MEDIDA Nº 8 MPre 5 **VOLANTES INFORMATIVAS OBJETIVO:** Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades influenciadas por la obra. **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Mitigar el Impacto Social causado por la construcción de la obra RESPONSABLE: Constructor ACTIVIDAD N° 1: rmación sobre el proyecto PROCEDIMIENTO: El contratista deberá informar a la comunidad de los trabajos que se realizarán en el sector, antes y durante la ejecución de la obra **DOCUMENTO DE REFERENCIA:** Especificaciones Técnicas del Proyecto INDICADORES VERIFICABLES: Registros de entrega y distribución de hojas volantes informativas **RESULTADOS ESPERADOS:** Comunidad informada adecuadamente sobre la obra

COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

Ing. Gregorio Banchón Z.

## FORMATO N° 3

**VOLANTE INFORMATIVA PARA LA COMUNIDAD** 

# NOMBRE DE LA PERSONA / EMPRESA / ENTIDAD QUE EJECUTA LA OBRA (CON LOGOTIPO)

#### "TITULO DEL VOLANTE"

#### **OBRA:**

PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL. SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-COPPERATIVAS: EL MIRADOR, LOMAS DE LA FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE, HORIZONTES DEL GUERRERO 1, 2 Y 3, GUERREROS DEL FORTÍN 1 Y UNIDOS POR LA PAZ 2-PARROQUIA TARQUI

MONTO: "Monto de la obra según contrato"

**DURACION:** "Duración de la obra según contrato"

**ENTIDAD CONTRATANTE:** 

**EMPRESA CONTRATISTA:** 

#### "PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO"

(A continuación se deben mencionar de forma muy breve pero explicita los siguientes aspectos)

- Objetivos que persigue la obra
- Mencionar incomodidades y alternativas: horario de trabajo, cerramiento de vías, utilización de maquinaria, vías alternas, etc.
- Concienciar a la comunidad sobre la importancia de los beneficios de la obra

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gragorio Banchon Z. tefe de la Unidad de Estudio y Programación

# • PLAN DE SEGURIDAD VIAL

#### MEDIDA N° 9 CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA

Mpre 6

#### OBJETIVO:

Prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Evitar accidentes personales /Mejorar la circulación peatonal/ Incomodidad a la comunidad por actividades de construcción

#### RESPONSABLE:

Constructor

Fiscalizador

#### ACTIVIDAD Nº 1:

Programa de señalización

#### PROCEDIMIENTO:

Considerar una serie de actividades tendientes a delimitar y señalizar las áreas de trabajo de tal forma de generar todas las condiciones de seguridad a los usuarios de la vía y a los obreros de la misma, en sus etapas de construcción y mantenimiento vial.

El propósito es que tanto los vehículos propios del Contratista, como los que eventualmente deben utilizar sectores de la vía en construcción, debido a cruces desvíos y accesos particulares, no constituyan un peligro para los propios trabajadores, los pobladores de la zona y los eventuales visitantes.



Especificación Técnica del Contrato

#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

Registros mensuales de la ejecución del Programa de Señalización Preventiva de la Obja

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

Obra debidamente señalizada

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**COSTO DE LA MEDIDA:** 

Costo incluído en el presupuesto de la obra

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Heidad de Estudio di Programación


MEDIDA N° 10 CONOS DE SEGURIDAI	MPre 7
OBJETIVO:	
Cumplir con la normativa ambiental vigente y reducir los	riesgos de accidentes en la vía
POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:	
Prevenir situaciones de peligro y afectaciones a la salud y	la seguridad de los trabajadores, usuarios y
transeúntes	
RESPONSABLE:	
Constructor	
Fiscalizador	
ALTIVIDAD N° 1:	
Verificación en la Obra	보는 사람들이 사용하는 하는 것이다.
PROCEDIMIENTO:	

Se emplearán para delinear carriles temporales de circulación, especialmente en los períodos de secamiento de pinturas sobre el pavimento, en la conformación de carriles de tránsito que entran a zonas de reglamentación especial y en general en la desviación temporal del tránsito por una ruta.

Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados en material plástico anaranjado, con protección ultrasolar para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto, de tal manera que no se deteriore ni cause daño a los vehículos.

Deben tener un mínimo de 450 mm de altura, con base de sustentación cuadrada, circular o de cualquier otra forma que garantice su estabilidad.

Los conos de 700 mm o superior deben utilizarse en vias de circulación que superan los 30 Km/h.

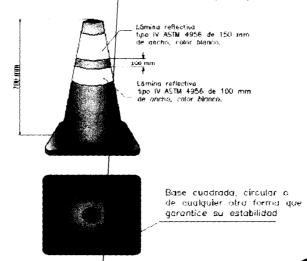

DOCUMENTO DE REFERENCIA:	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Especificaciones Técnicas del Proyecto	
INDICADORES VERIFICABLES:	
Estadísticas de accidentes en los frentes de obra	Ing Cregoria Ranchin Z.
Verificación in situ de los conos de seguridad	Ing. Gregorio Banchów Z.  lete de la Unidad de Estudio y Profilamación
RESULTADOS ESPERADOS:	ere de la criticad de Estadio y Frogramación
Obtener una circulación de vehículos y personas	de manera segura, a través del área de trabajo y alrededor
de ella.	
COSTO DE LA MEDIDA:	
Costo incluído en el presupuesto de la obra	

#### MEDIDA Nº 11 MPre 8 SEÑALES RETROREFLECTIVAS **OBJETIVO:** Cumplir con la normativa ambiental vigente y reducir los riesgos de accidentes en la vía **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Riesgos de accidentes por obstrucciones o peligros **RESPONSABLE:** Constructor Fiscalizador IVIDAD Nº 1: enficación en la Obra PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar los trabajos preliminares en la obra, el Contratista implementará una adecuada rotulación ambiental de carácter: 1) informativa, 2) preventiva y 3) de restricciones. Las señales informativas tendrán como objetivo el advertir a los trabajadores, visitantes y población aledaña a la zona de la obra sobre la ejecución de trabajos relacionados con la vía. Las señales preventivas tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios de la vía acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se presenten, especialmente en cuanto a la velocidad de circulación. Las señales de restricción señalarán las acciones que no se deben realizar a fin de no causar impactos ambientales negativos en el entorno. La temática particular para cada tipo de rótulo, así como el material y ubicación estarán contempladas en las especificaciones ambientales particulares o en su caso por el criterio del Fiscalizador. Este tipo de rotulación incluirá la fabricación y colocación de los letreros de acuerdo con los planos de la obra o disposiciones del Fiscalizador. En casos que se estime conveniente y previa apropación de la Fiscalización, se colocarán letreros con iluminación artificial en las zonas de peligro. Salvo casos en que la Fiscalización lo considere inconveniente, los letreros serán de madera tratada y con leyendas y dibujos en bajo relieve. DETALLES DE LETREROS **DOCUMENTO DE REFERENCIA:** AS MUNICIPALES **OBRAS** Especificaciones Técnicas del Proyecto **INDICADORES VERIFICABLES:** Reportes en el libro de obra Ing. Gregorio Banchón Z. **Fotos** tele de la Unidad de Estudio y Frogramación **RESULTADOS ESPERADOS:** Obtener una circulación de vehículos y personas de manera segura, a través del área de trabajo y alrededor de ella. **COSTO DE LA MEDIDA:** Costo incluído en el presupuesto de la obra

MEDIDA Nº 12 MPre 9 **BARRICADAS DE PROTECCION OBJETIVO:** Cumplir con la normativa ambiental vigente y reducir los riesgos de accidentes en la vía **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Prevenir situaciones de peligro y afectaciones a la salud y la seguridad de los trabajadores, usuarios y transeúntes RESPONSABLE: Constructor Fiscalizador CTIVIDAD Nº 1: renficación en la Obra PROCEDIMIENTO: Son dispositivos portátiles o fijos que tienen desde uno o tres listones con demarcaciones apropiadas y son usados para controlar movimientos vehiculares de los usuarios de la vía sobre cierres, restricciones o para delimitar todo un tramo de vía; deben ser instalados perpendicularmente a la dirección del tránsito al inicio del ÁREA DE SEGURIDAD; en caso de requerir más de una barrera estas serán instaladas en forma lateral a una distancia máxima de 1,00 entre barreras. Las bandas de las barreras deben ser de color blanco con naranja retroreflectivo alternados con una inclinación de 45°, que cumplan un grado de reflectividad de tipo IV/según Norma ASTM 4956. El ancho de las franjas deben ser de 150 mm excepto que se pueden usar franjas de 100mm el largo de bandas de 600mm las 65 BARRICADAS TIPO II BARRICADA PARA PASO DE VEHICULOS POR BARRICADAS TIPO I LADO IZQUIERDO DE LA BARRICADA BARRICADA PARA PASO DE VEHICULOS POR LADO IZQUIERDO DE LA BARRICADA RICADAS CON DIRECCION DEL PASO DE LOS VEHICUL ECCION DEL PASO DE LOS VEHICULOS **DOCUMENTO DE REFERENCIA:** OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Especificaciones Técnicas del Proyecto **INDICADORES VERIFICABLES:** Estadísticas de accidentes en los frentes de obra Banchón Z. Ing. Gregorio Verificación in situ de las barricadas lefe de la Unidad de Estudie y Programación **RESULTADOS ESPERADOS:** Obtener una circulación de vehículos y personas de manera segura, a través del área de trabajo y alrededor de ella. **COSTO DE LA MEDIDA:** Costo incluído en el presupuesto de la obra

## MEDIDA Nº 13 MPre 10 PARANTE DE MADERA CON PADO H.S **OBJETIVO:** Cumplir con la normativa ambiental vigente y reducir los riesgos de accidentes en la vía **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Riesgos de accidentes por obstrucciones o peligros RESPONSABLE: Constructor **Fiscalizador** TVIDAD Nº 1: ificación en la Obra PROCEDIMIENTO: Se suministrará e instalará una valla de protección configurada con parantes de caña rolliza con bases de hormigón simple de altura útil total de 1.50 metros, con diámetros entre 7.5 cm<ø<10 cm, los parantes de caña deberán tener dos franjas de cintas reflectivas separadas 15 cm o más de tal manera que caiga dentro del espacio entre nudos para su ubicación y fijado CAÑAS CON CINTAS PLASTICAS DISPOSITIVO DE CANALIZACION (DEL INEADOR TUBULAR O PITUTO) **DOCUMENTO DE REFERENCIA:** OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Especificaciones Técnicas del Proyecto INDICADORES VERIFICABLES: Reportes en el libro de obra manchón Z. Ing. Gregorio Fotos Lete de la Unidad de Estudio y Programación **RESULTADOS ESPERADOS:** Obtener una circulación de vehículos y personas de manera segura, a través del área de trabajo y alrededor COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

#### MEDIDA N° 14 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1.41

Mpre 11

#### **OBJETIVO:**

Prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Evitar accidentes personales /Mejorar la circulación peatonal/ Incomodidad a la comunidad por actividades de construcción

#### RESPONSABLE:

Constructor

Fiscalizador

#### ACTIVIDAD Nº 1:


e ificación en la Obra


#### PROCEDIMIENTO:

Estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán fabricados en material plástico de polietileno de color naranja. Estos elementos tendrán una altura mínima de 700 mm un diámetro no menor a 70 mm ni mayor a 100mm. Deben contar con tres bandas( cintas reflectivas) de 75 mm, separadas entre sí no menos de 100 mm, elaborada en lámina reflectiva blanca mínimo Tipo IV, cumpliendo con la norma ASTM 4956.

En su parte interior serán anclados a una base que garantice su estabilidad, la cual podrá contar con un lastre que contenga materiales deformables ( que no sea concreto ni piedras) y que le proporcione estabilidad en su posición vertical.

Cuando los delineadores tubulares se utilicen para hacer cerramientos en obras, podrán tener solamente dos franjas reflectivas separadas 15cm o más y deberán contar con un mínimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas demarcadoras de tres 75 mm de ancho y/o mallas plásticas, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada.

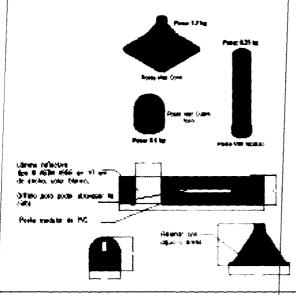



#### **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Especificación Técnica del Contrato

#### INDICADORES VERIFICABLES:

Registros mensuales de la ejecución del Programa de Señalización Preventiva de la Obra

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

Obra debidamente señalizada

#### **COSTO DE LA MEDIDA:**

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z.

lefe de la Unidad de Estudio y Reconstrucción


# MEDIDA N° 15 ELEMENTOS DE SUJECION O FUACION DE LETREROS OBJETIVO: Cumplir con la normativa ambiental vigente y reducir los riesgos de accidentes en la vía POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS: Prevenir situaciones de peligro y afectaciones a la salud y la seguridad de los trabajadores, usuarios y transeúntes RESPONSABLE: Constructor Fiscalizador A TIMIDAD N° 1: Pograma de señalización

#### PROCEDIMIENTO:

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de elementos de fijación o sujeción tipo Sign Fix o similar, el mismo que cumple las siguientes características: perfil de aluminio extrusado tipo "U" de 2.5x2.5x3mm largo=al 80% del ancho del letrero y abrazadera de platina galvanizada y pintada de 2x 2.5mm, de acuerdo con los requisitos de los documentos contractuales, del Manual de Dispositivos de Control de Trafico Uniformes del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004 "Señalización Vial parte 1: Señalización Vertical", del MOP y las instrucciones del Fiscalizador.

Estos elementos utilizados normalmente podrán yuxtaponerse los tableros de las señales verticales de tránsito preventivas (SP), Reglamentarias (SR) o Informativas de información general (S1) en los postes de concreto hidráulico u hormigón, acero de las redes de energía o teléfonos, etc., existentes, siempre y cuando la entidad que instaló el dispositivo autorice su adosamiento.

### ELEMENTOS DE FIJACION O SUJEÇION

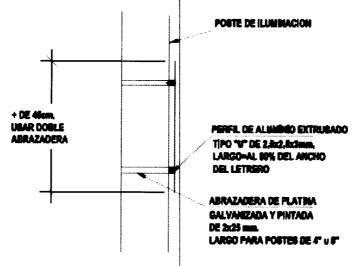

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Especificación Técnica del Contrato	
INDICADORES VERIFICABLES:	
Estadísticas de accidentes en los frentes de obra	Ing. Gregorio Banchón Z.
Verificación in situ de las barricadas	
RESULTADOS ESPERADOS:	lefe de la Unidad de Estudio y Pregramación
Obtener una circulación de vehículos y personas de maher	a segura, a través del área de trabajo y alrededor de
ella.	
COSTO DE LA MEDIDA:	**************************************
Costa incluído en el presupuesto de la obra	

Costo incluído en el presupuesto de la obra


# MEDIDA N° 16 BARRERAS DE SEGURIDAD/ POLIETILENO OBJETIVO: Prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS: Evitar accidentes personales /Mejorar la circulación peatonal/ Incomodidad a la comunidad por actividades de construcción RESPONSABLE: Constructor Fiscalizador ACTIVIDAD N° 1: Programa de señalización

#### PROCEDIMIENTO:

Son dispositivos en material de polietileno, resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta; utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular, cuando se requiera un cierre total o parcial de la vía. Generalmente como dispositivos de canalización, se colocan en serie a una distancia máxima de separación de 3 m; su color deberá ser naranja y contarán con franjas de lámina reflectiva tipo IV cumpliendo con la norma ASTM 4956, distribuidas en sentido horizontal y vertical. Las barreras plásticas deberán tener un diseño similar al mostrado en la figura.


Para lograr que estos dispositivos tengan un peso que evite su fácil movimiento, deberán ser llenadas con agua o arena. Sus dimensiones mínimas en metros serán: altura 0.60m, longitud 0.70 m y ancho 0.40 m.

Cuando su utilización sea nocturna, se hace necesario adosarles una lámpara intermitente.

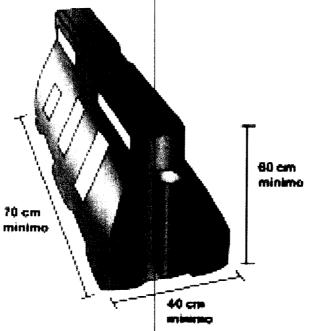

	ser) instrucți
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	
Especificación Técnica del Contrato	
INDICADORES VERIFICABLES: Registros mensuales d	e la ejecución del Programa de Señalización Preventiva
de la obra	
RESULTADOS ESPERADOS:	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Obra debidamente señalizada	, <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>
COSTO DE LA MEDIDA:	
Costo incluído en el presupuesto de la obra	Ing. Gregorio Banchón Z.
	tefe de la Unidad de Estudio y Programación

#### MEDIDA Nº 17 More 14 TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO INC. DISPOSITIVO DE SEÑAL LUMINOSA **OBJETIVO:** Prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Evitar accidentes personales / Mejorar la circulación peatonal / Incomodidad a la comunidad por actividades de donstrucción **RESPONSABLE:** Constructor Fiscalizador ACTIVIDAD Nº 1: Plograma de señalización PROCEDIMIENTO: Son usados para la prevención o canalización de los usuarios de la vía deben ser construídos de material polietileno resistente a impacto, liviano y deformable de color naranja. Ellos deben ser de un mínimo de 900 mm de altura y tendrán por lo menos 450 mm de ancho mínimo sin tomar en cuenta la orientación. La Tanquetas o canecas metálicas no deben ser usadas. Las demarcaciones en los tanques deben ser de bandas horizontales, circunferenciales, retroreflectivas blancas y anaranjadas alternadas de 100 a 150 mm de ancho. Cada tanque tendrá un mínimo de dos líneas anaranjadas y dos líneas blancas con la línea del tope siendo anaranjada, mínimo tipo IV cumpliendo la Norma ASTM 4956. Cualquiera de los espacios no-reflectorizados entre las líneas horizontales anaranjadas y blancas no excederán los 75 mm de ancho. Los tanques tendrán topes cerrados que no vayan a permitir la colección de desperdicios de construcción u otros desperdicios. Los tanques no deben contener arena, agua o cualquier material que los haría peligrosos para los usuarios de la vía o trabajadores cuando sean golpeados. Serán ubicados delineando el Area de transición, considerando la magnitud de la obra y el riesgo de la misma; estos dispositivos reemplazaran la utilización de los conos. En condiciones climáticas adversas de baja luminosidad serán complementados con dispositivos luminosos.

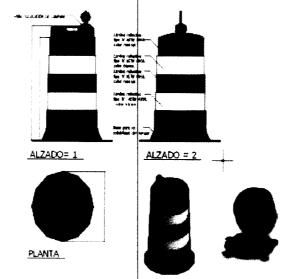

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	
Especificación Técnica del Contrato	
INDICADORES VERIFICABLES: Registros mensuales de la ejecución del Programa de	Señalización Preventivo de la Obra
RESULTADOS ESPERADOS: Obra debidamente señalizada	OBRAS PIBLICAS MUNICIPALES
COSTO DE LA MEDIDA: Costo incluído en el presupuesto de la obra	Ing. Gregorio Banchón Z.
	tefe de la Unidad de Estudio y Brogramación

### PLAN DE SEGURIDAD LABORAL

Con el fin de promover la seguridad y salud de los trabajadores, se han establecido algunas medidas para mitigar o prevenir los riesgos derivados del trabajo.

Sin embargo, cabe indicar que es recomendable que cada obra tenga un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, según la normativa legal:

✓ Registro Oficial N° 249 del 10 de Enero del 2008

Así como aplicar las leyes vigentes en el país con relación a este tema esto es:

- ✓ Resolución 957.- REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- ✓ **Decreto Ejecutivo 2393.-** REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
- ✓ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013 " SÍMBOLOS GRÁFICOS.COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD.

PARTE 1: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA SEÑALES DE SEGURIDAD E INDICACIONES DE SEGURIDAD

Estamos hablando, por lo tanto, de un documento de planificación muy enfocado a las necesidades concretas de la obra, por lo que tiene que ser elaborado por el jefe de obra y su equipo antes de iniciar los trabajos.

Las medidas de seguridad laboral necesarias que pueden tomarse para el presente provecto son las siguientes, las mismas que serán verificadas y controladas por la Fiscalización y Supervisión de la obra.

OBRAS PULLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. lefe de la Unitad de Estudio y Programación

OBJETIVO CERO ACCIDENTES: MODELO DE ENCUESTA DE AUTOEVALUACION AL INICIO DE L (CONSTRUCCIÓN)

\*\* Esta encuesta es orientativa, NO es una Evaluación de riesgos NI sustituye la misma, NI al Plan de Seguridad de la obra. Es una ayuda para detec MES: LMXJVS LMXJVS AÑO: LMXJV 1- LUGARES DE TRABAJO / ENTORNO DE LA OBRA 1.- Están señalizadas las entradas a la obra, diferenciando entrada peatonal y entrada de vehículos 2.- El orden y limpieza en la obra es adecuado (accesos, zonas de paso, almacenamientos exteriores e interiores, escombros, zonas de trabajo). 3.- Hay medios de extinción y botiquín en la obra, conoce su ubicación, son accesibles y se encuentran señalizados 2.- MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1.- Los mandos de accionamiento de las maquinas son visibles, están claramente lidentificados, no están en zonas peligrosas 2.- Los organos moviles de las maquinas disponen de resguardos o dispositivos de seguridad adecuados que los dejan inaccesibles y en caso de corte de energía, se quedan en posición segura 3.- En las máquinas con protecciones regulables, la protección se autoregula con el manejo dejando la parte peligrosa de la máquina siempre protegida 4.- Tiene instrucciones de seguridad claras y concretas para el manejo de la maquinaria de su puesto de trabajo 5.- La herramienta manual eléctrica, neumática, se encuentra en buen estado (cables, mangueras, conexiones, carcasas, interruptores) 6.- La herramienta manual se encuentra en buen estado, limpia y colocada en el lugar destinado para la misma (cajas de herramientas) 7.- En caso de usar plataformas de descarga, tienen doble barandilla de protección (borde e interior) o si sólo hay una, se usa sistema anticaídas al salir a la plataforma. 3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.- Cuadros eléctricos. Se encuentran cerrados, protegidos frente condiciones meteorológicas adversas, señalizados y sin defectos aparentes. 2.- Los cables, enchufes, clavijas ya sean fijos o en alargaderas están en buen estado y sin defectos aparentes En caso de usar grupos electrógenos, se encuentran con las puertas cerradas, carcasas, enchufes y diferenciales en buen estado, sin fugas y con pica de toma de tierra clavada. 4.- PROTECCIONES COLECTIVAS Redes: 1.- Protegen en su totalidad huecos (terrazas, balcones, ventanas) y bordes de forjado (estructura), no quedando aberturas entre ellas por mal atado o por estar rotas. 2.- En caso de uso redes verticales para proteger estructura, hacen bolsa adecuada, sobrepasan 1m la planta superior a proteger. 3.- En caso de uso de redes horizontales como protección se colocan a la altura y con la tensión que especifican las instrucciones del fabricante. Barandillas: 1.- Protegen en su totalidad huecos (excavación, zanjas, terrazas, balcones, ventanas) y

bordes de forjado (estructura), son rígidas y fijadas sólidamente a la estructura.

							_						_					
-	2 Cuentan con listón superior de suficiente altura (mínimo 90cm), listón intermedio y	†	T	T			$\top$	T			$\top$	T	T		$\exists$	Ŧ	$\top$	Ť
	rodapié.	<u> </u>	ᆫ	┖		oxdot	4	L	Ш	Ц	┸	┸	1	Ц	$oldsymbol{\perp}$	4		1
	3 Los huecos del suelo (ventilación, saneamiento,) se protegen en su totalidad con	1	l						1		ł	1	ł		ı	ı	ł	1
	protecciones de suficiente solidez y quedan bien fijadas dichas protecciones.		_	L	Ш	$\perp$	4	L			_	┸	4	Ш	_		_	1
	Líneas de vida:	+	-		-	$\vdash$	-	+	╂╌┤	$\vdash$	+	+-	┼	Н	-1	+	+	╁
	1 Están colocadas con la tensión, altura y especificaciones que marca el fabricante en	1						1		1		1	ı				ı	ı
	sus instrucciones.	$\perp$		Ц		Щ	_	┕	Ш		┸	┸	1	Ц	_		ᆚ	┸
	2 Se utilizan equipos retráctiles, cuerdas con amortiguación u otro sistema certificado	1					- 1		1		- [	1	ı		. 1			ı
	para el anclaje del amés del trabajador a la línea de vida  Revisiones:	┺		$\vdash$		_	_	$\vdash$	$\bot$	_	$\dashv$	1	4	Ш	<b>-</b>	$\dashv$		↓
					4		-	1					1					ı
	1 Las redes verticales/horizontales, barandillas y líneas de vida están certificadas 2 Las redes verticales/horizontales, barandillas y líneas de vida se revisa su estado de	╄	<u> </u>	Ш	_	-	-	$\vdash$	Н	-	-	╀	1	Н	4	4	_	4
		П		H		1			1	- 1							-	ı
-	forma periódica según especifique el fabricante	╁╌┦	L.	Ш			┙	L	$\perp$			J	J	Ш	Щ.	ㅗ		1
	5 MEDIOS AUXILIARES	<u> </u>						_					_					
i	Andamios tubulares:	1 1		1 1				1	IJΙ	ı			l	lł				Ι
	1 El apoyo de los andamios es sobre sus propios piés, nivelándolo con los mismos y no			ΙI	- 1				1 1			İ						ı
	se usan otros materiales tipo ladrillos, bovedillas, para dicha nivelación. Si lleva ruedas,	1			- 1	-												ı
	están frenadas	Ш		Ш	_	_	4	$\perp$	Ш	_		_	1.		_	<b>⊥</b>	丄	L
	2 La plataforma de trabajo tiene una anchura mayor o igual a 60cm y disponen de	ΙI			- 1				П			1				- [	ı	ı
	barandilla perimetral (listón superor a 90cm, listón intermedio y rodapié)	Н		Н	_	_	4	_	Ш	4	$\bot$	╄			4	4	_	1
	3 El acceso a las plataformas de trabajo se realiza mediante escaleras interiores,	Ιİ		ĺΙ		- 1			ļΙ	ſ					ı			ı
1	abatibles e integradas.	Н		Н	_		4	$\vdash$	1	_	$\bot$	┺		Ц	4	4	_	Ļ
ļ	4 La separación de la fachada es menor o igual a 30cm.	Ш		Ш			╝	L							丄	Ш.		L
	5 Hay arriostramiento horizontal o vertical en andamios tubulares perimetrales según								П			Π				$\neg$	Т	Γ
	indicaciones del fabricante					_ 1	1	1			1	l	H					ı
	Andamios a motor y andamios colgados:	$\Box$		$\Box$	$\dashv$	=	4			7		-	Н	$\neg$	7	Ŧ	#	Ŧ
1	1 La/s torre/s para el movimiento del andamio a motor se apoya/n sobre terrenos	] ]			-				1 1							1	-	
	estables y están arriostradas según indica el fabricante. En los andamios colgados, los	1 1			- 1	- 1	1		1 1				l				1	l
	pescantes están fijados al forjado de forma adecuada	Ш					╛	L	ш	┙					丄	$\perp$		Ĺ
	2 La plataforma de trabajo tiene una anchura mayor o igual a 60cm y disponen de													- 1	ı			Ι
	barandilla perimetral (listón superor a 90cm, listón intermedio y rodapié). Los accesos son				- 1	- 1	1	1				İ				I	1	ı
ŀ	adecuados,	Ш				丄	╝	$\perp$							丄			L
Ŀ	3 La separación de la fachada para los andamios es menor o igual a 30cm.								H									I
ŀ	4 Los órganos móviles de estos equipos disponen de resguardos o dispositivos de		$\Box$		П		1		П	Т	$\top$	П		T	Т	Т		Г
	seguridad adecuados que los dejan inaccesibles	ΙI		- 1		ı		Ī		-	1							C
Ī	5 Los mandos de accionamiento de estos equipos son visibles, están claramente	Н	┪	ヿ	┪	_	1		$\Box$	$\top$	+-	T		寸	十	十		t
- Ji	dentificados y sólo funcionan si se manejan de forma intencionada.	l			- 1		1										1	l
1	Andamios borriquetas:	П	ヿ	寸	T		1		$\Box$	$\top$	1	П		_	十	十	1	۴
ŀ	1 La plataforma de trabajo tiene una anchura mayor o igual a 60cm, son estables, no		ļ		- 1	-											1	ı
	sobresaldrán más de 20 cm de las borriquetas y quedan unidas a las mismas.							L		Į				- 1			1	Ų
ŀ	2 Las borriquetas serán de estructura resistente y se colocarán a una distancia adecuada						1			П				П	Т	Т		
Ŀ	que haga que el andamio en su conjunto sea estable.	li	- 1		-	ļ	1	J I				1 1		- 1			1	
Г		П	Ī	ヿ	T	Т	1			1	1	П		T	T	T	1	Ī
- 1 -	Escaleras manuales:		J	- 1	- [													
[]	Si se usan escaleras manuales en su puesto de trabajo, tienen zapatas antideslizantes					ᆚ	1	Ш				Ш			丄	丄		L
	2 Las escaleras manuales que se usan no les faltan peldaños, o tienen peldaños		ſ		ĺ									T	Т	Т	T	
	loblados o rotos, son de estructura resistente y de altura adecuada a los trabajos a		- [								1							
ľ	ealizar	$\perp$					╛	Ш			Щ.	Ш	L		丄	丄		L
6	5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL																	
1	Cada trabajador tiene el equipo de protección individual necesario para su trabajo y	Т	П	Т	Т	$\top$	7	П	Т	Т	Т		Γ	Т	$\top$	$\top$	Т	Г
	os utiliza cuando sean necesarios, estando en buenas condiciones.		1										- [		1			ĺ
			_				_						L					_

GGA

#### MEDIDA N° 18 PROTECCION PARA TRABAJADOR

MPre 15

#### **OBJETIVO:**

Mantener la integridad física de los trabajadores y visitantes en obra.

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Salud y Seguridad Laboral; Salud y Seguridad Pública

#### RESPONSABLE:

Constructor


#### ACTIVIDAD Nº 1:


Planificación de actividades

#### PROCEDIMIENTO:

- Se deberá suministrar a cada trabajador y visitante dentro de la obra, un equipo completo de protección personal, que conste de: casco, guantes, tapones auditivos, botas, mascarillas, lentes de protección, pantalones largos, impermeables, arnés y cualquier otro implemento considerado necesario por el constructor.
- Disponer de un sitio higiénico para guardar los equipos de protección personal en condiciones óptimas.
- Renovar los equipos de protección personal cada vez que sea necesario, ya sea por pérdida o daño de los mismos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL





#### **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Especificaciones y Memorias técnicas, Plan de Manejo Ambiental, Manual de Seguridad Laboral

#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

Verificación diaria del uso de los equipos de protección personal

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchón Z. Lefe de la Unidad de Estudio y Programación

#### MEDIDA N° 19 CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN

MPre 16

#### **OBJETIVO:**

Dar a conocer a los trabajadores y moradores del área de influencia sobre los reglamentos, normas y especificaciones que deben cumplirse en la obra y en el funcionamiento de la vía de aceso.

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Salud y Seguridad Laboral; Salud y Seguridad Pública

#### **RESPONSABLE:**

Constructor

#### ACTIVIDAD Nº 1:

Manificación de actividades

#### PROCEDIMIENTO:

Se realizará una charla – taller donde se dé a conocer el contenido del Plan de Manejo Ambiental, la normativa ambiental, normas y recomendaciones de seguridad y salud para los moradores del área de influencia, así como la aplicación de primeros auxilios y del plan de contingencia en casos de emergencia. Contenido de la Charlas:

- 1.- Introducción y Definiciones Generales (5 minutos)
- 2.- Explicación de cada una de las medidas ambientales a aplicar en el funcionamiento de la Obra.

Educación Ambiental: Ruido y desechos (25 minutos)

Respeto a las señalizaciones colocadas en los alrededores de la Obra (20 minutos)

Acciones y decisiones a tomar en caso de accidentes o emergencias (20 minutos)

- 4.- Nociones básicas de Primeros Auxilios (30 minutos)
- 5.- Explicación del plan de contingencia (20 minutos)
- 6.- Foro de Preguntas y Respuestas de los asistentes (10 minutos)
- 6.- Conclusiones y recomendaciones (5 minutos)

Tiempo total aproximado de duración de la charla: 2 horas 15 minutos.

El objetivo de los temas propuestos es dar a conocer a los trabajadores de la Obra los diferentes componentes y medidas del plan de manejo ambiental del proyecto, y facilitarles los conocimientos básicos para que realicen sus actividades laborales cumpliendo y siendo responsables en la aplicación de las medidas ambientales y sobretodo buscando la seguridad pública y laboral. Con las nociones de primeros auxilios que se les impartirá se ayudará a sostener situaciones de emergencia durante el desarrollo del proyecto. El perfil del expositor será un profesional de tercer nivel o delegado de la Cruz Roja, que tenga conocimientos sobre planes de manejo ambiental, primeros auxilios y recursos humanos.



#### **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Especificaciones Técnicas del Contrato

#### INDICADORES VERIFICABLES:

Certificación de la asistencia de los obreros a la charla.

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

✓ Trabajadores capacitados y responsables que cumplan con las medidas OBRAS

✓ Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.

Trabajadores capacitados para atender emergencias por accidentes.

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banglion Z.

### MEDIDA Nº 20 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES

MPre 17

#### **OBJETIVO:**

Predautelar y conservar el bienestar de los diferentes trabajadores que formarán parte de la ejecución, así como también de los transeúntes.

#### POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:

Salud y Seguridad Laboral ; Salud y Seguridad Pública

#### RESPONSABLE:

Constructor


### ACTIVIDAD Nº 1:

la hificación de actividades

#### PROCEDIMIENTO:

Se construirá con estructuras de madera, y serán determinadas durante la ejecución de la obra, de preferencia en los sitios donde se realizan excavaciones para movimiento de tierras y colocación de tuberías, en todo caso de acuerdo a la concurrencia de peatones y al tráfico del sitio, estas ubicaciones serán indicadas por el Fiscalizador.

Estos trabajos incluyen la estructura de sostenimiento, que servirá para el paso de los habitantes del sector donde se ejecutan los trabajos.

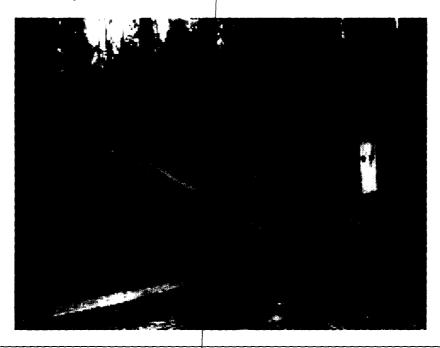

ı			
ı	DOOL		DE REFERENCIA:
В		INTERIOR	THE REFERENCE ID.

Especificaciones y Memorias técnicas, Plan de Manejo Ambiental, Manual de Segurid<u>ad L</u>aboral

#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

Reportes en el libro de obra

Fotos

OBRAS PL

BLICAS MUNICIPALES

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

Minimizar accidentes de los transeúntes

#### COSTO DE LA MEDIDA:

Costo incluído en el presupuesto de la obra

Ing. Gregorio Banchon Z. lefe de la Unidad de Estudio primareción

## • PLAN DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO

MEDIDA N° 21 MMit 4 CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO **OBJETIVO:** Cumplir con la normativa ambiental vigente y mantener los estándares de calidad ambiental del aire **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Generación de enfermedades por el polvo Evitar molestias a la vecindad en su descanso vespertino. RESPONSABLE: Constructor Fiscalizador CTIVIDAD Nº 1: Venficación en la Obra PROCEDIMIENTO: El transporte de materiales deberá efectuarse a velocidades menores a 40 km./h y las volquetas deberán estar cubiertas con lonas. El constructor deberá humedecer continuamente las áreas abiertas en proceso constructivo. El constructor deberá dotar a los trabajadores mascarillas o implementos necesarios de uso personal durante la jornada de trabajo. El material particulado será determinado en una estación estratégicamente ubicada cerca a los principales receptores (considerar la dirección de los vientos en la zona). Cada medición durará un lapso de una hora durante la jornada laboral de la construcción (8h00 hasta las 18h00) **DOCUMENTO DE REFERENCIA:** Especificaciones Técnicas del Proyecto MUNICIPALES OBRAS INDICADORES VERIFICABLES: Reportes de los monitoreos Ing. Gregorio Banchón Z lefe de la Unideo de Estudio y Programación **RESULTADOS ESPERADOS:** Minimización de la contaminación del aire por material particulado, cumpliendo las normas vigentes y el impacto en la calidad de vida de los trabajadores y ciudadanos. **COSTO DE LA MEDIDA:** 

Costo incluído en el presupuesto de la obra

### MEDIDA Nº 22 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO **OBJETIVO:** Cumplir con la normativa ambiental vigente y mantener los estándares de calidad ambiental del aire **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** Generación de enfermedades por el ruido Interrupción de actividades educativas. Molestias a las personas que habitan en el sector, trabajadores y estudiantes. RESPONSABLE: Constructor Fiscalizador ACTIVIDAD Nº 1: Medición de niveles de ruido PROCEDIMIENTO: Por orden del Fiscalizador, la maquinaria, equipos y vehículos de transporte que genere ruidos superiores a 75 dB, deben ser movilizados desde los sitios de obra a los talleres para repararlos y sólo retornar una vez que cumplan con la norma. Para el control y corrección del ruido y vibraciones, el Fiscalizador podrá disponer que el Contratista ejecute algunas de las siguientes acciones: Reducir la causa generadora, mediante la utilización de silenciadores de escape en todo vehículo, maquinaria y equipos. Aislamiento de la fuente emisora mediante la instalación de locales cerrados para los talleres de mantenimiento de maquinaria, generadores y otro equipo estacionario de funcionamiento prolongado. Control y/o eliminación de señales audibles innecesarias tales como bocinas y pitos.

# **INDICADORES VERIFICABLES:** Reportes de monitoreos **RESULTADOS ESPERADOS:**

Disminuir la contaminación sonora y el impacto en la calidad de vida de las moradores del área de influencia del proyecto.

OBRAS P

MUNICIPALES

MMIt 5

**COSTO DE LA MEDIDA:** 

Costo incluído en el presupuesto de la obra

Ing. Gregorio Banchon Z. lefe de la Unidad de Estudio y Programación

### MEDIDA N° 23 **CONTROL Y MONITOREO DE GASES**

MMR 6

Cumplir con la normativa ambiental vigente y mantener los estándares de calidad ambiental del aire.

**POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:** 

Generación de enfermedades

Evitar molestias a la comunidad

RESPONSABLE:

Constructor

**Fiscalizador** 

CTVIDAD Nº 1:

Velificación en la obra

#### PROCEDIMIENTO:

Este trabajo consistirá en realizar el monitoreo de la emisión de gases de combustión, por efecto del uso de los equipos de construcción, maquinarias, transporte y los gases producidos por funcionamiento de la maquinaria en el área de construcción, para ser evaluadas respecto a la Norma de Calidad de Aire Ambiente , del TULAS (Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, para lo cual es necesario, realizar mediciones en las zonas aledañas al proyecto.

Las mediciones de los gases se realizará mediante la utilización de un Analizador Multifunción Portátil, hasta con 4 sensores para medición de: Oxígeno, monóxido de carbono,NO/NOx,CxHy y cálculo de CO2.

Las horas en que se realizarán los monitoreos son: 8h00 a 17h00; Duración del muestreo será de 30 minutos. La frecuencia de los muestreos serán al inicio de la obra (antes de que se proceda a cualquier acción de construcción), cuando se proceda a ejecutar las actividades de movimiento de tierras y durante la fundición de estructuras de hormigón.





UBLICAS MUNICIPALES

INDICADORES VERIFICABLES:

Reportes de monitoreos

**RESULTADOS ESPERADOS:** 

Ing. Gregorio Banchón Z. Minimización de la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo las normas vigliates la la contaminación del aire, cumpliendo vida de los trabajadores y ciudadanos.

**COSTO DE LA MEDIDA:** 

Costo incluído en el presupuesto de la obra

## • TRABAJOS AGRONÓMICOS

#### MEDIDA Nº 24 MANEJO DE VEGETACIÓN, ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS

MMit 7

Establecer los lineamientos y acciones de control ambiental necesarias para minimizar los efectos ambientales derivados de la remoción de vegetación y retiro de árboles durante la construcción del proyecto.

#### **POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS MITIGADOS:**

Corte innecesario de la vegetación colindante y afectación del aspecto paisajístico

#### **RESPONSABLE:**

Constructor //Fiscalizador

#### ACTIVIDAD N° 1:


Control, remoción y limpieza de cobertura vegetal y árboles

#### PROCEDIMIENTO:

En caso de requerirse el retiro de especies arbóreas y arbustivas en el área de construcción del proyecto, será necesario solicitar los permisos respectivos a la Dirección de Áreas Verdes de la M. I. Municipalidad de Guayaguil.

Una vez se adquieran los permisos respectivos, se deberán:

- Podar los árboles.
- Realizar la desinfección del árbol podado antes de su retiro.
- Realizar la excavación para proceder luego a su retiro. La excavación se debe realizar de 4,00 a 4,00 m2, con el fin de no afectar las raíces.
- Se deberá proceder al retiro del árbol y trasladarlo en una plataforma al lugar donde será reubicado.
- Se deberá asegurar que el lugar donde sea replantado el árbol, haya sido adecuadamente preparado con tierra vegetal y fertilizantes orgánicos.
- Una ver replantado, se deberá ver por su implantación adecuada, regándolo cada dos días estrictamente por un periodo de uno a dos meses.



#### **INDICADORES VERIFICABLES:**

- Permisos respectivos para el retiro de árboles y arbustos.
- Registros de control del correcto manejo de despeje de vegetación, retiro y reubicación de árboles.

RESULTADOS ESPERADOS:

Conservación de la flora natural del sector.

**COSTO DE LA MEDIDA:** 

Costo incluído en el presupuesto de la obra

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Gregorio Banchon Z.

lefe de la United de Estudio y Pargramación
